LogiStock SA — Charte du projet

Oct 21, 2026 · @Ahmed

LogiStock SA a besoin d'une application de gestion de stock, livrée en 12 semaines par l'équipe du Groupe 3 (7 personnes), en 4 phases et 3 jalons.

1. Contexte et objectifs

Contexte. LogiStock SA suit son stock sans outil adapté. L'application centralise les produits, les mouvements de stock et les alertes de rupture.

Objectifs

- Livrer une première version utilisable de l'application en 12 semaines.
- Suivre en temps réel les entrées, les sorties et les niveaux de stock.
- Prévenir les ruptures grâce à des seuils d'alerte par produit.
- Travailler en Scrum, avec un backlog suivi sur Trello et le code sur GitHub.

2. Périmètre

Dans le périmètre

- Gestion des produits, des catégories et des fournisseurs.
- Enregistrement des mouvements de stock et historique.
- Alertes de seuil et tableau de bord de stock.
- Gestion des utilisateurs et de leurs droits.

Hors périmètre

- Facturation, comptabilité et paiement en ligne.
- Application mobile native (la version web suffit).

3. Équipe et règles de fonctionnement

Ahmad Keita est Scrum Master et Anthioumana Boiguile est Product Owner.

Rôle	Nom	Responsabilité
Product Owner	Anthioumana Boiguile	Priorise le backlog, valide les fonctionnalités

Rôle	Nom	Responsabilité
Scrum Master	Ahmad Keita	Anime les réunions, lève les blocages
Équipe de développement	5 autres membres du Groupe 3	Conçoit, code, teste et documente

Règles de fonctionnement


- Sprints courts, avec une réunion de planification au début et une revue à la fin.
- Toute tâche est une carte Trello avec un responsable ; la liste « En cours » reste à jour.
- Code sur GitHub : branche `main` stable, branche `develop` pour l'intégration, une branche par fonctionnalité.
- Aucune fusion dans `develop` sans relecture par un autre membre.
- Une absence ou un blocage est signalé à l'équipe le jour même.
- Les décisions importantes sont validées par le Product Owner.

4. Phases et jalons

Le projet démarre le 18 octobre 2026 avec la phase 0 de cadrage et dure 12 semaines. Le découpage ci-dessous est à ajuster avec le plan de projet.

Phase	Contenu	Jalon
0. Cadrage	Charte, cahier des charges, outils (GitHub, Trello), backlog	Jalon 1 : charte et cahier des charges validés
1. Conception	Modèle de données, maquettes, architecture	Jalon 2 : conception validée
2. Développement	Sprints de réalisation des fonctionnalités	—
3. Tests et livraison	Tests, corrections, documentation, démonstration	Jalon 3 : livraison de la version finale

Trois jalons rythment les quatre phases du projet

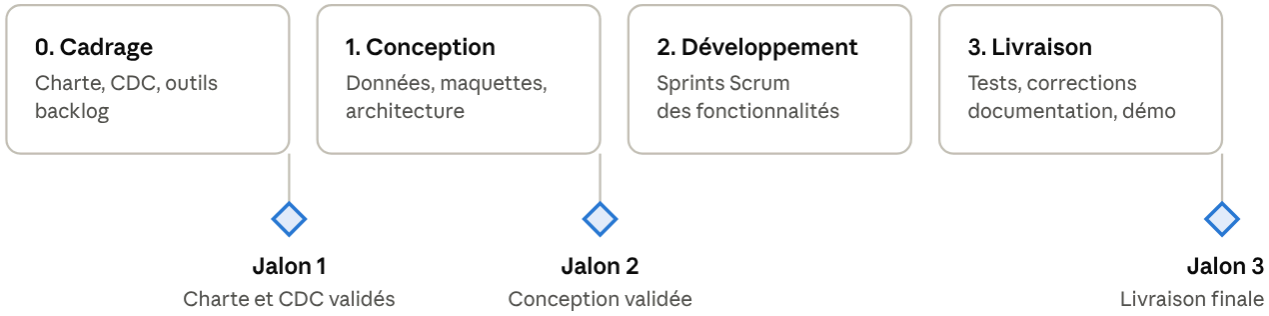

Phases de taille égale, non à l'échelle. Début le 18 octobre 2026, durée totale 12 semaines.

roadmap · 4 phases, 3 jalons

Les jalons 1 et 2 ferment les phases 0 et 1 ; la phase 2 enchaîne les sprints jusqu'à la livraison du jalon 3.

5. Risques

Risque	Parade
Peu de data et pas de Wi-Fi chez certains membres	Travailler par petites tâches, synchroniser GitHub quand la connexion est disponible
Disponibilité inégale des membres	Répartir par binômes, suivre l'avancement chaque semaine
Périmètre qui grossit	Le Product Owner arbitre, tout ajout passe par le backlog
Conflits de code	Branches courtes et relecture avant fusion
